

# 建替工事進行中です



平成31年10月から  
の供用開始を予定し  
ている白石斎苑は造  
成工事が完了し、平



1. 新白石斎苑  
正面玄関イメージ図  
2. 白石斎苑の工事状況  
(10月時点)


成30年10月末時点で  
20%が終了していま  
す。  
工事は次のスケ  
ジュールのとおり実  
施する予定であり、  
新斎苑の供用開始後  
に現斎苑の解体を行  
い、跡地に新たな駐  
車場を整備します。

| 年    | 平成30年 |     |   |      | ... | 平成31年 |   |   |   |   |   | ...     | 平成32年 |   |   |
|------|-------|-----|---|------|-----|-------|---|---|---|---|---|---------|-------|---|---|
| 月    | 6     | ... | 9 | 10   | ... | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | ...   | 1 | 2 |
| 工事概要 | 造成工事  |     |   | 建築工事 |     |       |   |   |   |   |   | 現斎苑解体工事 |       |   |   |
|      |       |     |   |      |     |       |   |   |   |   |   | 駐車場整備工事 |       |   |   |

▲10月から供用開始予定

仮設駐車場を  
ご利用ください

白石斎苑は工事に伴い、敷地内の駐車場が使用できないことから、会葬者の皆さまは斎苑入口にある仮設駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。

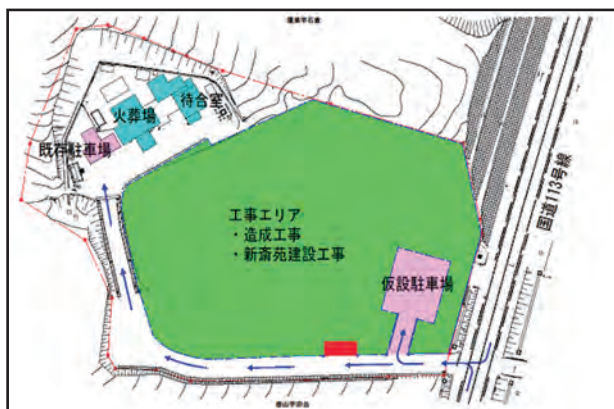

▶ 柴田斎苑の工事状況  
(10月時点)

平成31年4月からの  
供用開始を予定してい  
る柴田斎苑の進捗状況  
は、平成30年10月末時  
点で38%が終了してい  
ます。  
現在は、建築工事が  
本格化しており、供用  
開始に向け、順調に工  
事が進んでいます。

